



Autobahn A9 im Oberwallis



A9 verbindet das Wallis
Medienorientierung - 22.10.2024

CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS



Ablauf

Begrüssung, Einführung und Gesamtüberblick

Staatsrat Franz Ruppen, Departementsvorsteher DMRU

Stand Realisierung und Ausblick A9 Oberwallis

Marco Walter, Chef der Dienststelle für Nationalstrassenbau

Projekte und Aktuelles A9 Wallis

Valentina Kumpusch, Vizedirektorin ASTRA, Leiterin Strasseninfrastruktur West

Schlussfolgerungen und Prioritäten für die Zukunft

Staatsrat Franz Ruppen

Fragen und Antworten

CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS



Begrüssung, Einführung und Gesamtüberblick

Staatsrat Franz Ruppen, Departementsvorsteher DMRU

Stand Realisierung und Ausblick A9 Oberwallis

Marco Walter, Chef der Dienststelle für Nationalstrassenbau

Projekte und Aktuelles A9 Wallis

Valentina Kumpusch, Vizedirektorin ASTRA, Leiterin Strasseninfrastruktur West

Schlussfolgerungen und Prioritäten für die Zukunft

Staatsrat Franz Ruppen

Fragen und Antworten

CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS



Begrüssung, Einführung und Gesamtüberblick

Staatsrat Franz Ruppen, Departementsvorsteher DMRU

Stand Realisierung und Ausblick A9 Oberwallis

Marco Walter, Chef der Dienststelle für Nationalstrassenbau

Projekte und Aktuelles A9 Wallis

Valentina Kumpusch, Vizedirektorin ASTRA, Leiterin Strasseninfrastruktur West

Schlussfolgerungen und Prioritäten für die Zukunft

Staatsrat Franz Ruppen


Fragen und Antworten

CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS

Siders – Leuk/Susten



- **2025 beginnen weitere Vorarbeiten, ab 2026 das erste grosse Bauilos**
- *Entscheid Bundesgericht noch ausstehend.*
- *Sobald der Entscheid gefallen ist, dauert es 6-9 Monate bis die ersten Arbeiten beginnen: Submissionen Baupiste, Swisssgasleitung, Turbo-Kreisel Cloux-Roussier und Rodungsarbeiten bereit.*
- *Detailprojekte Materialbewirtschaftung, Gedeckter Einschnitt, Tunnel Susten zur Genehmigung beim ASTRA.*



CANTON DU VALAIS
KANTON VALAIS

- **Pfyngut dient künftig als Materialzwischenlager für die A9 Bauwerke mit eigener Kiesaufbereitung**




April

CANTON DU VALAIS
KANTON VALAIS



Mai

CANTON DU VALAIS
KANTON VALAIS

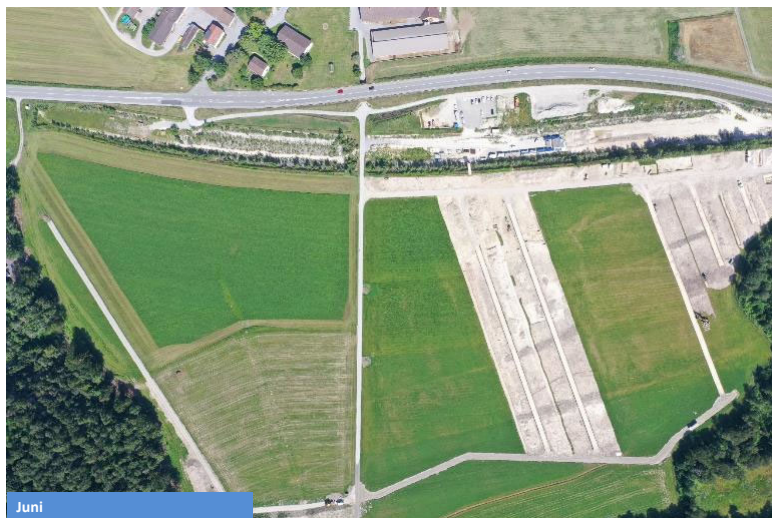

Juni

CANTON DU VALAIS
KANTON VALAIS



Juli

CANTON DU VALAIS
KANTON VALAIS



August

CANTON DU VALAIS
KANTON VALAIS




September




Skelette 18. Jahrhundert

- **Provisorische Baupiste als Hauptschlagader**

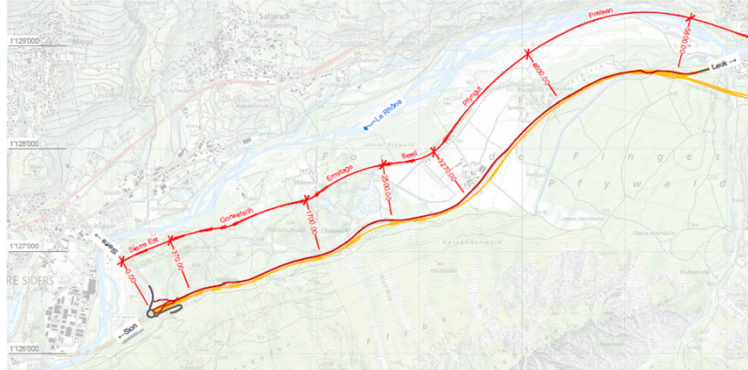

- *Ausweichstrasse bei allfälligen Einschränkungen auf der T9 Nordseite der Rhone.*
- *Variantenstudium Verkehrsführung während der Bauarbeiten.*

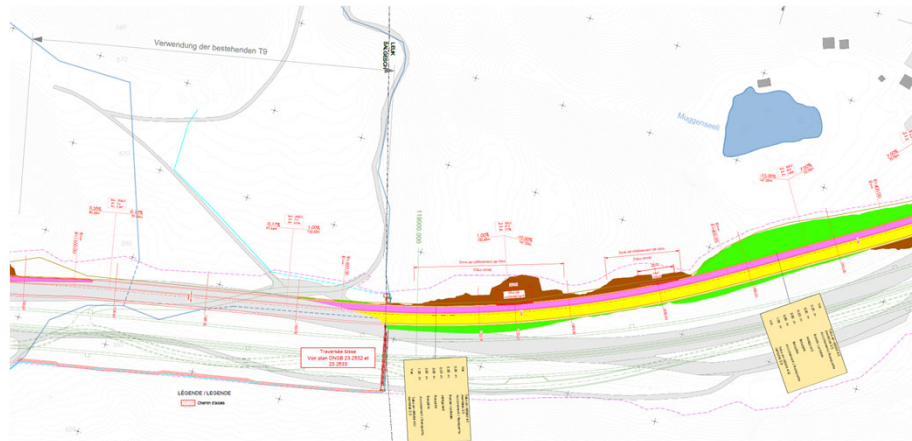


- *Pfyngwaldstrasse wird abschnittsweise nach Norden verlegt.*
- *Für die Anbindung Alt / Neu wird der Verkehr temporär umgeleitet.*

Leuk/Susten bis Gampel/Steg



- Erkundungs- und Entwässerungsstollen: vom Vorprojekt bis zum Baubeginn in 5 Monaten

Übersicht Monatsgeschwindigkeiten

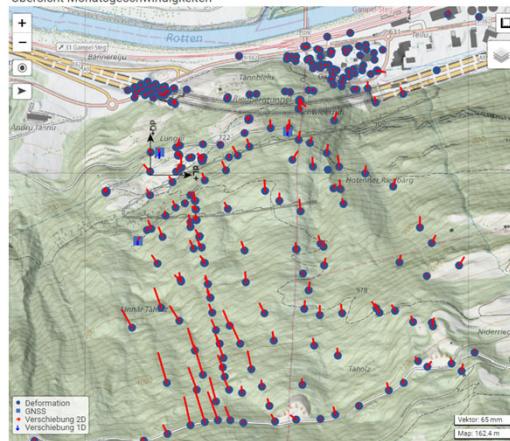


CANTON DU VALAIS
KANTON VALAIS

Gesamtübersicht Hangbewegung




2018: 350 mm Niederschlag / 28 Tage → max 70 mm / Mt Hangbewegung
 2023/24: 190 mm Niederschlag / 28 Tage → max 76 mm / Mt Hangbewegung

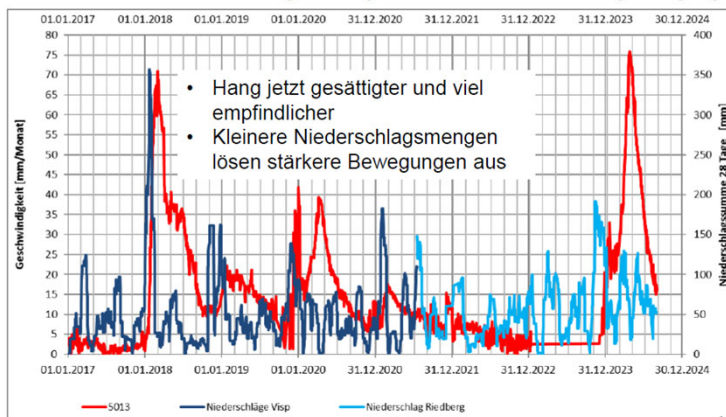


CANTON DU VALAIS
KANTON VALAIS


Brücke Tennen - Verschiebungen

- Auswertung Verschiebungen (Einfluss auf Brücke)

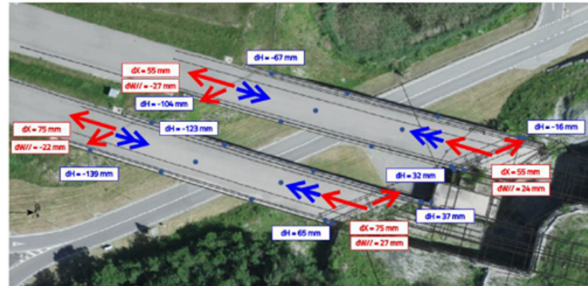

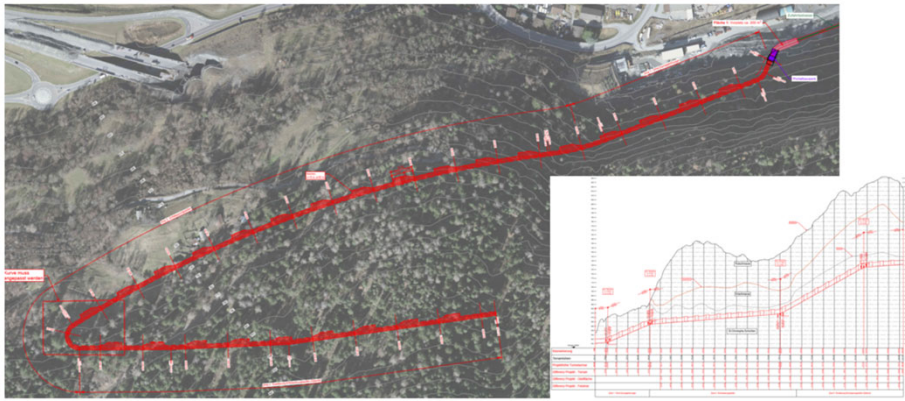

CANTON DU VALAIS
KANTON VALAIS

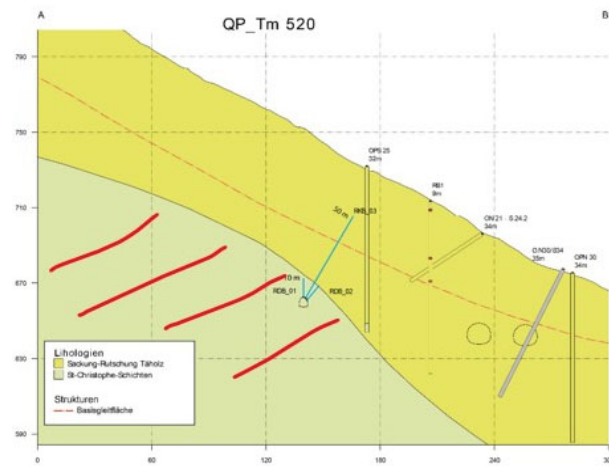

CANTON DU VALAIS
KANTON VALAIS



- Mai 2024: Analyse Bestvariante und Vorprojekt
- 18.09.2024 : Entscheidung des Staatsrats
- 02.10.2024: Vorarbeiten Steinschlagschutznetz
- Ab Mitte Oktober 2024: Voreinschnitt
- November 2024: Erste Sprengung
- Dezember 2026: Fertigstellung

CANTON DU VALAIS
KANTON VALAIS



- **Tunnel Riedberg: Inbetriebnahme 2027**



CANTON DU VALAIS
KANTON VALAIS


Gampel/Steg - Visp



- Alles «Schwarz»

FILM 3MIN. MITTELS DROHNE VON RARON BIS STALDBACH MIT ERKLÄRUNGEN WÄHREND DEM FILM:


CANTON DU VALAIS
KANTON VALAIS

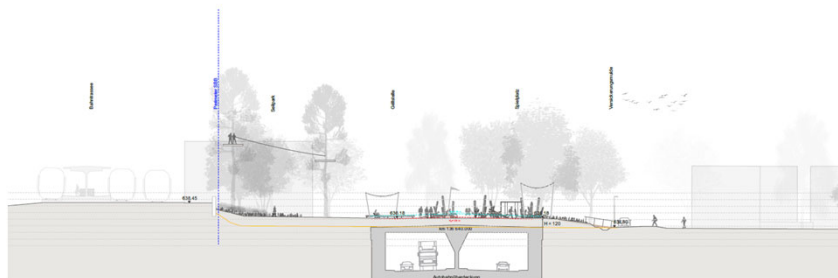

CANTON DU VALAIS
KANTON VALAIS



- **Juni 2025 Schritt Nr. 1 zur verkehrlichen Entlastung von Visp mit der Inbetriebnahme der A9 Südumfahrung**

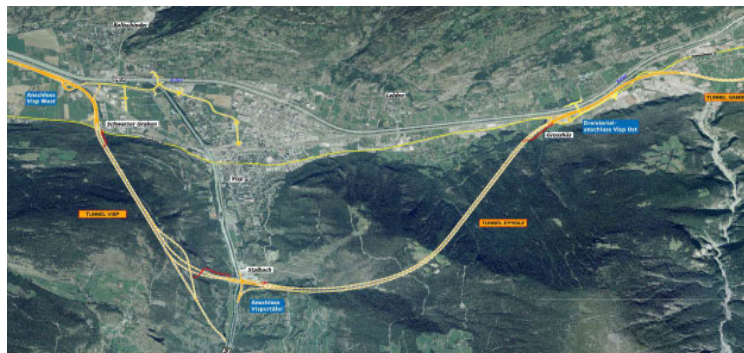


	2024												2025											
	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Ju	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
SPERRUNGEN																								
TVSP																								
TEYH																								
AUSFÜHRUNG																								
Montageabschluss/MEK																								
Mängelbehebung/SRNa																								
Inbetriebnahme SR																								
Inbetriebnahme Netzwerk																								
IBS VTV und NTA																								
Aufbau Testanlagen																								
Montage und Konfiguration LS																								
IBS Feldgeräte bis LS																								
Integration SRK auf AR 2 (SIT)																								
IBS auf AS 2																								
SAT 1 (Anlagentest SR)																								
Mängelbehebung/Nachtest																								
IGT SR																								
Mängelbehebung/Nachtest IGT SR																								
Migration NR auf AR 2																								
IGT TVSP																								
IGT TVSP-TEYH																								
Probetrieb																								
Abnahmen																								
Eröffnung																								





- **Schritt 2 ab Herbst / Winter 2025: «Normaler» Verkehr in Visp und Raron nach der Inbetriebnahme der A9 von Visp West bis Gampel/Steg Ost**

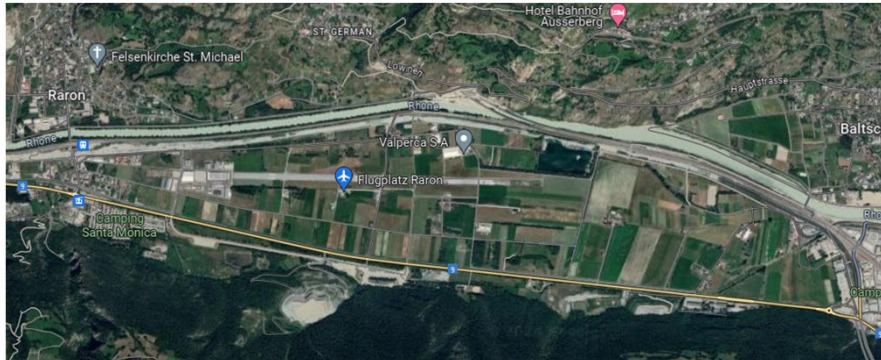

CANTON DU VALAIS
KANTON VALAIS



Begrüssung, Einführung und Gesamtüberblick

Staatsrat Franz Ruppen, Departementschef DMRU

Stand Realisierung und Ausblick A9 Oberwallis

Marco Walter, Chef der Dienststelle für Nationalstrassenbau

Projekte und Aktuelles A9 Wallis

Valentina Kumpusch, Vizedirektorin ASTRA, Leiterin Strasseninfrastruktur West

Schlussfolgerungen und Prioritäten für die Zukunft

Staatsrat Franz Ruppen

Fragen und Antworten

CANTON DU VALAIS
KANTON VALAIS



Begrüssung, Einführung und Gesamtüberblick

Staatsrat Franz Ruppen, Departementschef DMRU

Stand Realisierung und Ausblick A9 Oberwallis

Marco Walter, Chef der Dienststelle für Nationalstrassenbau

Projekte und Aktuelles A9 Wallis

Valentina Kumpusch, Vizedirektorin ASTRA, Leiterin Strasseninfrastruktur West

Schlussfolgerungen und Prioritäten für die Zukunft

Staatsrat Franz Ruppen

Fragen und Antworten
